

# 新島村特定環境保全公共下水道事業式根島処理区

## 整備計画(平成28年度認可)の整備スケジュールの

### 一部変更(処理場・管渠工事着手の延期)について

現行の式根島処理区の下水道整備計画は、平成28年度に認可申請を行い、申請どおり認可されたものです。村では、これに従って整備を行うため、平成31年度から処理場と管渠(汚水を送水する配管)の工事に着手し、処理場は4年後の34年度末(35年3月末)には完成する計画でした。管渠については11年後の42年度までに全処理区で工事を完了する予定で、処理場が完成した35年以降は、それまでに完成している管渠に接続できる一部住宅について、供用を開始する予定で準備を進めていたところですが、本年2月から3月にかけて行った現行計画の一部変更に係る計画の縦覧期間中に、現行計画そのものに反対する意見書が23件(詳細は、新島村ホームページに掲載中)提出されました。

村といたしましては、正式な反対意見が出されたことについて、真摯に受止めており、誠実に対応していくつもりですが、とりわけ平成27年1月に実施した現行計画に関する説明会において、処理場が従前の浜津城からソバ地区(スポーツ広場の道向)に変更されたことが、32人の出席者で決定されたことを不当と指摘している点や、計画の開始時点から15年が経過して住民の高齢化が進み、下水道への必要性が薄れているのではないか、という意見については、再度検証しておくことも必要であると考えております。

そのため、3月以降式根島島内において様々な方々に現行計画についての意見をお聞きし、地域における意見の集約を依頼してまいりましたが、いまだ把握には至っておりません。

下水道整備事業は、多額の費用が必要になる事業で、村の予算だけで実施するのは困難であり、国や東京都の補助金をもらって行うものとなっておりますが、その補助金の申請の期限は、実際に工事をいう年の前年の5月末日となっております。従って、来年着工を予定している式根島下水処理場及び管渠工事の申請期限は、今年の5月末日までとなっております。このまま、通常どおり申請を行えば、確実に31年度に着工せざるを得なくなり、上記の確認も取れないままに決行することとなります。

以上のことを総合的に検討した結果、村では31年度開始予定の処理場及び管渠工事の補助金申請を1年先送し、本年度中に、式根島全世帯に対する下水道事業に関するアンケート調査を実施し、その結果をもって最終的な方針を決定することとしました。これにより、アンケートの結果に関わりなく工事着手は32年以降となることとなります。また、結果次第では更に数年の繰延べとなる可能性もあります。

下水道事業の早急な実施を望まれている皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、住民全体で下水道について再考していただくため必要な期間として、ご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。


なお、本紙右面には、これまでの式根島における主な下水道事業の経過、本紙裏面には現行計画の施設概要と今後のスケジュールを掲載しておりますので、是非ご確認いただき、アンケート実施の際には、式根島の将来のための最良の選択を行っていただきますようお願い申し上げます。

平成30年6月 新島村役場 建設課 下水道係

### これまでの新島村(式根島)の主な下水道事業の経過

- ・平成3年 生活排水処理(下水道)に関するアンケート調査(本村・若郷・式根島全世帯対象)を実施  
配布世帯1,182(本村798、若郷125、式根島259)、回収734(本村511、若郷68、式根島155) 回収率62.1%(本村64.0%、若郷54.4%、式根島59.8%)。回収したうち、是非整備してほしい506件、整備するにしても急ぐことは無い53件、計76.1%の世帯が整備に賛成。東京都へ強く要望し、下水道事業を進める。
- ・平成15年5月 式根島地区の下水道に関するアンケート配布281世帯、回収207、回収率73.7%
- ・平成15年6月 式根島連絡協議会(10名)にアンケート結果を基に説明
- ・平成15年10月 式根島住民公聴会実施(5月アンケート結果他について) 71名出席
- ・平成15年11月 式根島地区の下水道に関するアンケート配布278世帯、回収152、回収率54.7%
- ・平成16年11月26日 式根島海底送水管更新事業計画及び式根島下水道事業計画説明会を実施。
- ・平成17年度 式根島下水道整備検討業務
- ・平成17年12月8日 式根島地区下水道事業計画に関する住民説明会実施。32名出席。  
この説明会の時に島内7か所(案)を提示。処理場の施設規模6,000㎡予定。
- ・平成18年度 式根島地区下水道整備検討業務
- ・平成20年8月 東京都汚水処理施設整備構想図に式根島も特定環境保全公共下水道で採択
- ・平成22年度 式根島住民対象の本村地区下水道事業(工事現場・処理施設)見学会2回実施。  
会計検査院の監査が入り、新島村の規模及び観光人口等の見直しを指摘される。  
新島村特定環境保全公共下水道式根島処理区全体計画作成したが保留する。
- ・平成23~25年度 新島村特定環境保全公共下水道事業全体計画の見直し(会計検査院の指摘の為)。  
3ヵ年で3回のアンケート調査実施。
- ・平成25年度 新島村特定環境保全公共下水道事業基本計画説明書(式根島処理区)作成
- ・平成26年度 H27年1月13日 式根島地区下水道事業計画に関する公聴会実施。参加者31名  
H17年の時には処理場6,000㎡を見直しにより最小規模にし3,000㎡に変更。縮小により再度北側(案)と南側(案)を公聴会で2案を提示。北側(案)ソバ地区が賛成多数の為、式根島の下水道事業が遅れていることから、早期実現に向け手続き開始。
- ・平成27年度 新島村特定環境保全公共下水道事業 アクションプラン策定及び事業計画変更認可設計
- ・平成28年度 新島村特定環境保全公共下水道事業 式根島処理区地質調査及び平面図作成
- ・平成29年2月 第4回事業計画変更に伴う縦覧(2/22~3/13) この事業計画変更で式根島処理区も特定環境保全公共下水道事業として整備していくための認可変更(縦覧者0人)
- ・平成29年3月14日 第4回事業計画変更協議申出書提出。3月24日、東京都から了する通知。
- ・平成30年2月1日 式根島地区下水道事業住民説明会実施 参加者33名
- ・平成30年2月 第5回事業計画変更に伴う縦覧(2/21~3/12) 縦覧者8名
- ・平成30年3月 縦覧期間中の意見書23件受理
- ・平成30年3月26日 縦覧結果をHP等で公表
- ・平成30年3月23日 第5回事業計画変更協議申出書提出。5月23日、東京都から了とする通知。

# 新島村特定環境保全公共下水道事業式根島処理区現行計画施設概略図

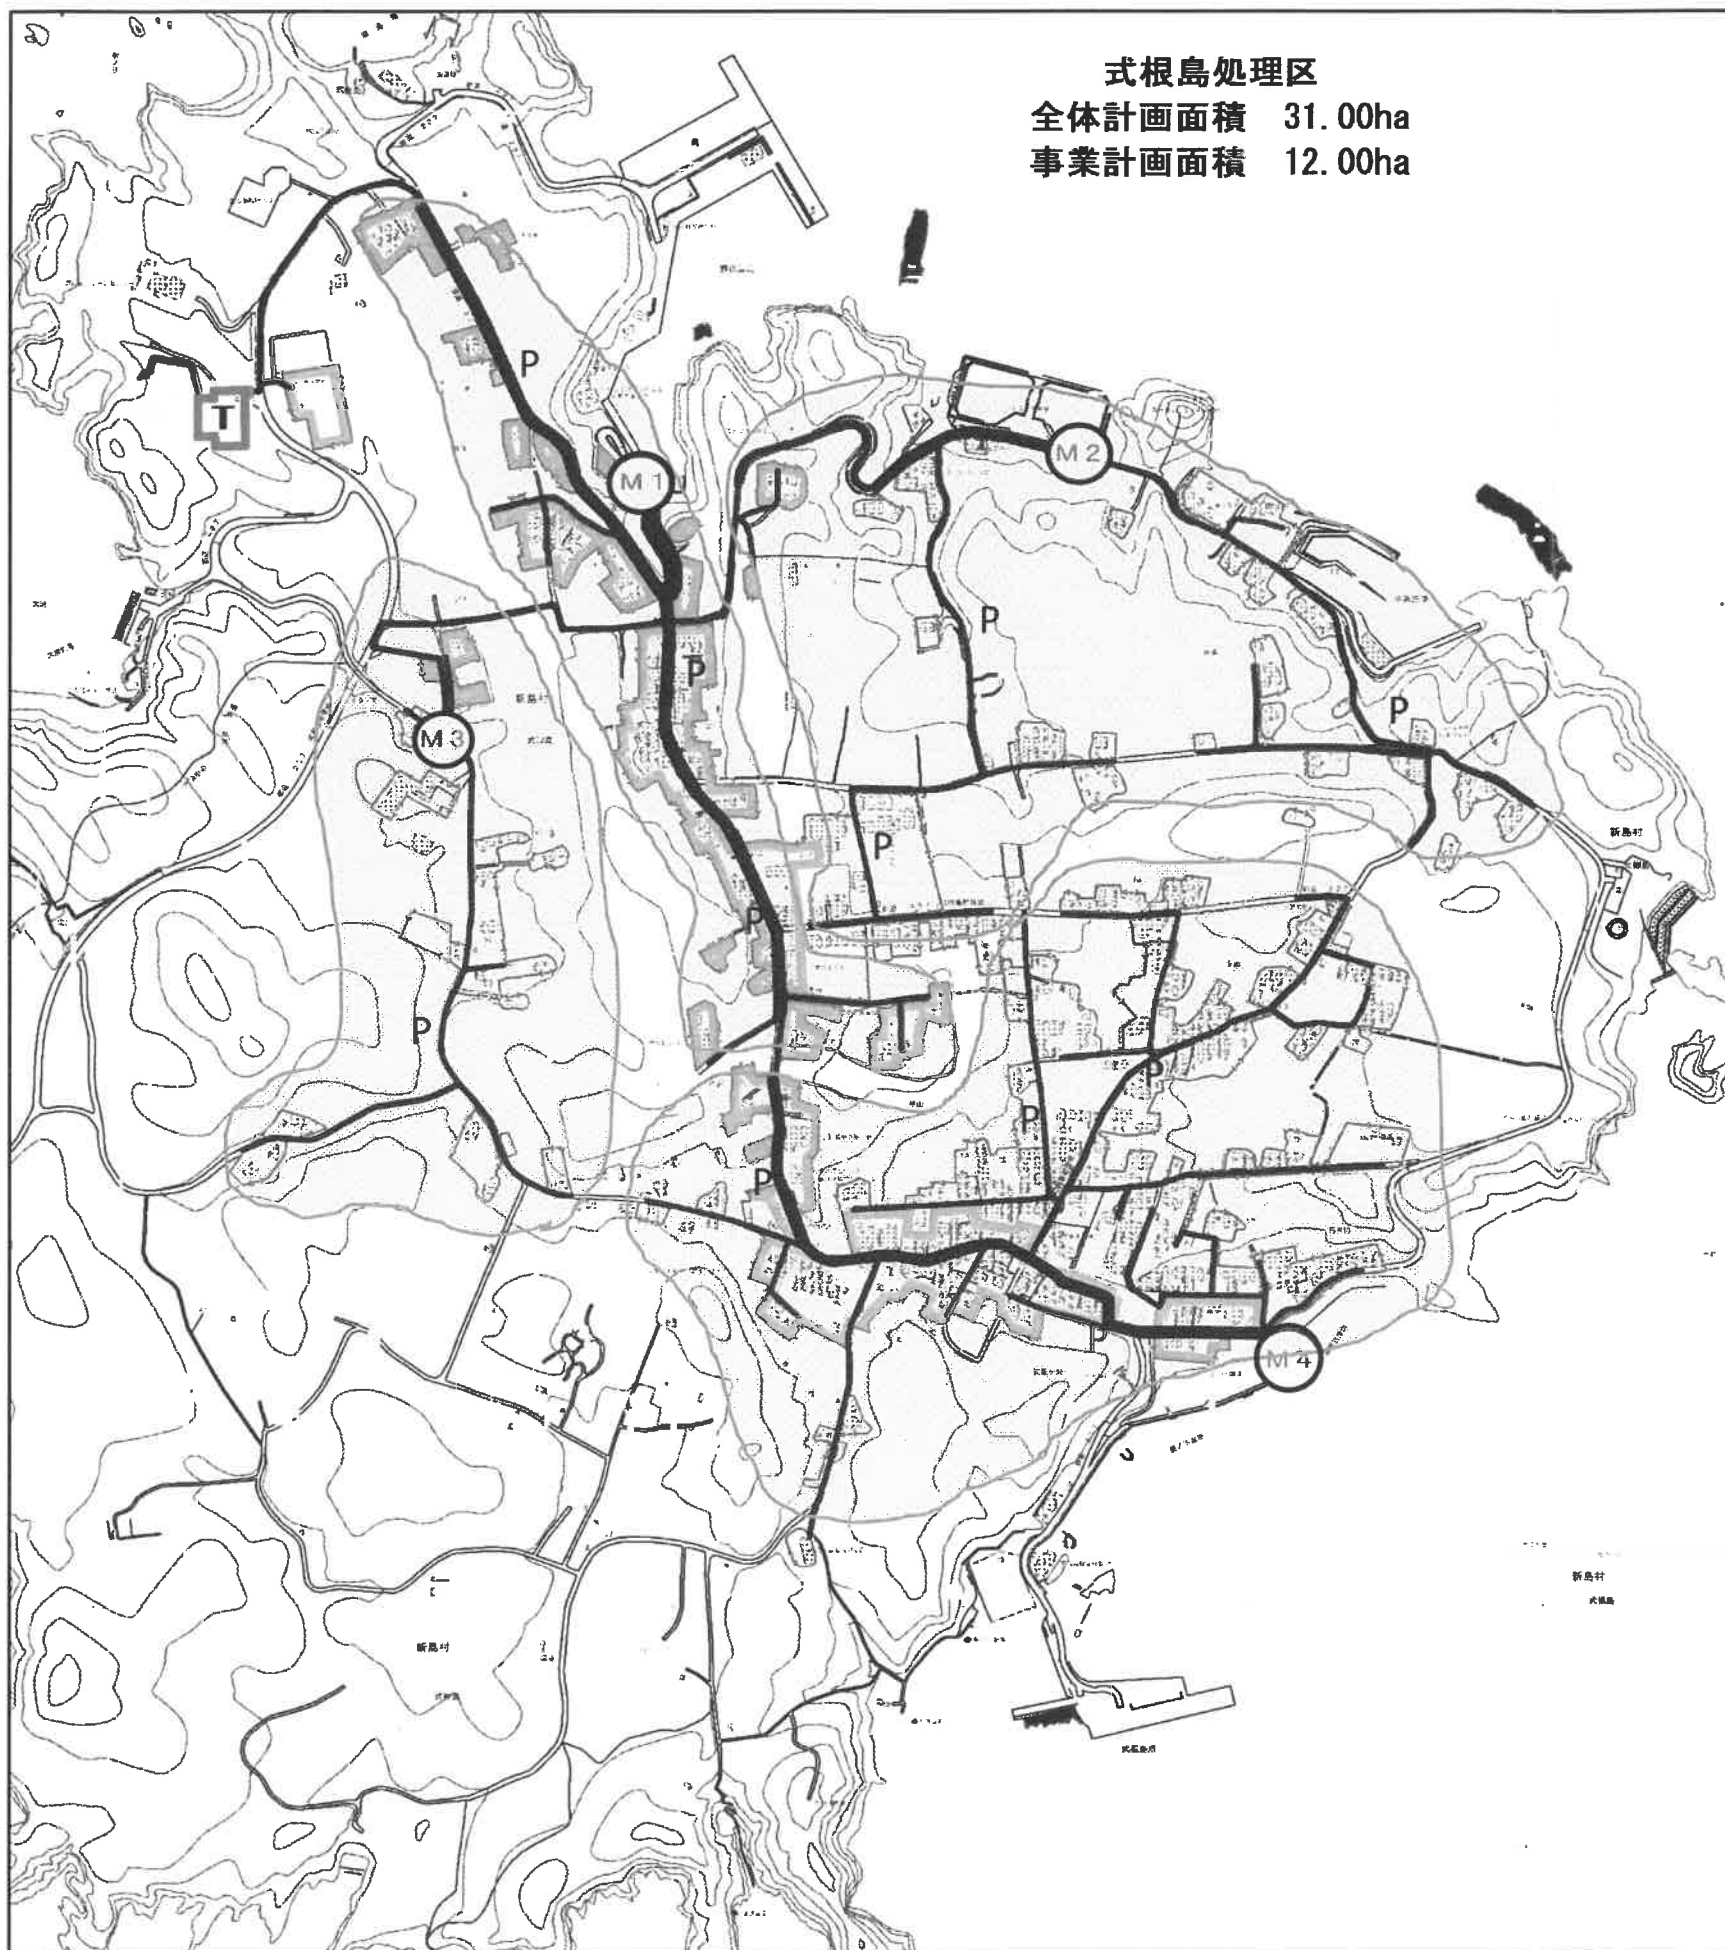

## 凡例

T …下水処理場

処理区から集水された汚水を、生物化学的処理工程等を経て国の基準に適合した水質に浄化します。

場所は、ソバ地区内（スポーツ広場の都道を挟んだ道向）です。

M …マンホールポンプ

各家庭からの排水された汚水は、自然流下方式(人工的な圧力を加えず、管に勾配をつけることで自然な流れを促す方法)で集水しますが、処理区全体では起伏が一定しておらず、1個所に集水することが非効率なため、地形に応じて処理区全体を4地区に分割(網掛けしている範囲)し、それぞれの地区の最も低い部分にマンホールポンプを設置します。マンホールポンプは、基本的に地下設備で地上には点検用の出入り口が出ているだけとなります。マンホールポンプに集水された汚水は、ポンプにより圧送され、最終的に処理場へ送水されます。

4個所のマンホールポンプの場所は、

M1…菊水旅館前付近、M2…ふなかつ造船所付近

M3…前抗プラント下三叉路付近、M4…石白川海岸トイレ付近

なお、M2からM4までに集水した汚水は、さらにM1に集水され、その後処理場に送水されます。

P …主な管渠（下水管）

各家庭から排水された汚水を自然流下方式によりマンホールポンプに導く配管です。—— M1へ集水、—— M2へ集水、—— M3へ集水、—— M4へ集水

—— 圧送管

※現行計画では、今年度に詳細設計、H31～34年度にかけ処理場と下水管の埋設(処理場から信号・郵便局・式根島支所・奥山商店・石白川海岸のルート)と菊水旅館前付近と石白川海岸トイレ付近のマンホールポンプ設置を行い、H35年度よりそのルートの一部供用開始する予定でした。

## 今後の予定

- ・9月～10月頃 式根島地区全世帯に対するアンケート調査  
式根島地区下水道の大切なアンケートですので、多くの回答をお願いします。
- ・12月頃 村の最終決定
- ・1～2月頃 式根島地区住民説明会

※現行計画のままで行くと判断した場合、H32年度から工事着手となります。仮に処理場の位置の変更等が生じた場合は、少なくとも4～5年工事着手が遅れる見込みです。
